




provincie **HOLLAND**
ZUID

Ministerie van VROM
t.a.v. minister J.C. Huizinga-Heringa
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag



Lid Gedeputeerde Staten

F.D. van Heijningen

Contact
T 070 - 441 60 74
F 070 - 441 79 92
fd.van.heijningen@pzh.nl

Postadres provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum - 9 MRT 2010

Ons kenmerk
PZH-2009-xxx
Uw kenmerk

Bijlagen
2 (Voortgangsrapportage en
herijkingsprogramma)

Onderwerp

Voormalige gasfabrieksterreinen:

voortgangsrapportage herontwikkeling en sanering

Geachte minister Huizinga,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage 2008 van het programma gasfabrieksterreinen. Tevens informeren wij u als IPO-stuurgroep over de herijking van dit programma.

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage vloeit voort uit de 'Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen' (Intentieverklaring) uit 1999. De programmatische aanpak maakt bodemsanering op deze terreinen mogelijk en geeft gemeenten en marktpartijen de kans om deze te betrekken bij herontwikkeling. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de leefomgeving van deze gebieden sterk.

Hierna volgen de belangrijkste conclusies van de rapportage.

- De Intentieverklaring omvat 148 locaties.¹ Met de sanering is tot 2015 ruim € 600 miljoen gemoeid, exclusief BTW, waarvan circa € 290 miljoen rijksbijdrage;
- Tussen 2002 en 1 januari 2009 zijn circa 50 grondsanereringen afgerond;
- Noord-Holland en Gelderland hebben voor alle locaties op programmaniveau afspraken gemaakt met gemeenten en energiebedrijven;
- Vrijwel alle overheden² verwachten dat de locaties, met hulp van marktdynamiek, vóór 2015 worden gesaneerd danwel beheerst.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bussen 18,
22, 65 stoppen dichtbij
het provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

¹ Exclusief de opgave in Zeeland en Den Haag (aparte regeling). Flevoland heeft geen gasfabrieken.

² Dat geldt niet voor Rotterdam. In de voorgaande rapportages is aangegeven dat daarover aparte afspraken zijn gemaakt met u (w ministerie).

Herijking

De afspraken lopen tot 2015. Als voorbereiding op de derde, laatste, periode (2010-2015) zijn in 2008 alle programma's herijkt. De geraamde kosten zijn daarbij geactualiseerd. Daarnaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en potentiële marktopbrengsten opnieuw bezien.

U heeft aangegeven:

- bij het toekennen van middelen zo mogelijk rekening te houden met deze herijking;
- voorkeur te hebben voor een finale financiële afwikkeling vóór 2015;
- een argumentatie te verlangen voor een hogere benodigde rijksbijdrage.³

Voor 2010-2014 hebben de gezamenlijke overheden circa € 145,7 miljoen rijksbijdrage nodig.^{4,5}

Multiplier

De multiplier was in 2003 rond de 2,47 (40% rijksbijdrage). In de herijking komt deze uit op 2,21 (45% rijksbijdrage).⁶ Duidelijk is dat:

- de beschikkingen voor 2002-2004 ook de bestuurlijk gebonden bedragen bevatten voor 2005-2014;
- de multiplier vanaf de eerste periode ruim onder de 3 ligt (> 33% rijksbijdrage);
- meer dan 50% van de kosten wordt gefinancierd buiten de rijksbijdrage om;
- de multiplier verschilt per locatie en is uiteraard het gunstigst⁷ op dynamische locaties.

Sanering van de gasfabrieken wordt mede gefinancierd met de opbrengsten van de (her)ontwikkeling. Bij veel locaties komen ruimtelijke ontwikkelingen alleen tot stand als er voor het saneren en ontwikkelen een prikkel beschikbaar is (financieel, juridisch of anderszins).

De financieel-economische crisis maakt een succesvol beroep op bijdragen vanuit de markt momenteel moeilijk(er). Het behalen van de beoogde multiplier in de laatste periode is voor een deel van de locaties, vanwege het ontbreken van ruimtelijke ontwikkeling c.q. dynamiek, een

³ hoger dan 1/3 van de totale werkelijke saneringskosten.

⁴ inclusief de aan de gasfabrieken gerelateerde waterbodemsaneringen van Friesland en Amsterdam.

⁵ Dit bedrag is achterhaald: Na 31-12-2008 is op verzoek van u met Amsterdam afgesproken om een deel van haar opgave en ook de daarmee gepaard gaande rijksbijdrage te temporiseren.

⁶ Zonder Rotterdam.

⁷ Een ongunstiger situatie valt waar te nemen op:

- statische locaties;
- waar beheersmaatregelen worden getroffen;
- waterbodems;
- waar verplichtingen zijn aangegaan onder het oude regiem (90% rijksbijdrage);
- waar cofinanciering door energiebedrijven is beperkt door overeenkomst op basis van voorgaande wet- en regelgeving, danwel in sommige regio's niet mogelijk was;
- regio's met beperkte herontwikkelingsmogelijkheden (slechte economische situatie).

probleem, zo niet een onmogelijke opgave. Vandaar dat een grotere rijksbijdrage noodzakelijk is geworden. Deze bijdrage is opgenomen in de decentralisatie-uitkering bodem.

Hoogachtend,
IPO Stuurgroep Gasfabrieken

F.D. van Heijningen, voorzitter

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor ontbreekt een fysieke handtekening.

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage over 2008 (Samenvatting jaarverslag bodemsanering over 2008);
- Herijking programma gasfabrieken, versie 04.

Afschrift aan:

- IPO-stuurgroep gasfabrieksterreinen:
Provincie Drenthe, t.a.v. mevrouw T. Klip-Martin, Postbus 122, 9400 AC Assen;
Provincie Groningen, t.a.v. de heer R.A.C. Slager, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Gasfabriekterreinen

Intentieverklaring

In 1999 is door VROM, EZ, de provincies en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring ondertekend voor een succesvolle aanpak van de gasfabrieken. Rotterdam heeft de intentieverklaring niet ondertekend, maar wel de programmatische aanpak onderschreven en zich bij het project aangesloten. De belangrijkste ingrediënten van de intentieverklaring zijn als volgt:

- herontwikkeling van de gasfabriekterreinen in een programmatische aanpak;
- sanering (functionele en kosteneffectieve benadering) van de bij het overgrote gedeelte van de locaties aanwezige aanzienlijke bodemverontreiniging, vóór 2015;
- financiering van deze aanpak van de bodemverontreiniging regelen door partijen die belang hebben bij de sanering en ontwikkeling van een specifieke locatie, of clusters van locaties, voor het grootste deel te laten bijdragen;
- Rijksbijdrage (Wbb budget) op basis van het gehele programma (dus inclusief de niet-urgente gevallen van ernstige bodemverontreiniging).

De 'Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabriekterreinen' omvat 148 gasfabrieklocaties. Met de sanering van de gasfabriekterreinen is tot 2015 ruim € 600 miljoen gemoeid, waarvan circa € 290 miljoen aan Rijksbijdrage (bedragen exclusief BTW; op basis van resultaten van de herijking; periode 2002-2014).

Maatschappelijke baten

Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring waren er al gasfabrieken gesaneerd. De sanering van de overige gasfabrieklocaties stagneerde echter. De programmatische aanpak van de oude gasfabrieksterreinen maakt bodemsanering mogelijk en geeft gemeenten en marktpartijen de kans om deze terreinen te betrekken bij herontwikkeling, waarmee de kwaliteit van de leefomgeving van een veel groter gebied sterk verbetert.

IPO werkgroep BO-08

De IPO werkgroep BO-08 faciliteert de uitvoering van de regionale gasfabriekenprogramma's. De voortgang van de programma's wordt via deze samenvatting jaarlijks gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De minister van VROM ontvangt jaarlijks een uitgebreide rapportage. Daarvoor dient dit keer de notitie over de herijking die in 2008 heeft plaatsgevonden.

Voortgang

In de eerste programmaperiode (2002-2004) zijn 40 saneringen gestart (27%) en van 2005 t/m 2008 samen nog eens 30,5 saneringen. Per 1-1-2009 zijn 50,5 grondsanereringen afgerond. De provincies Noord-Holland en Gelderland hebben inmiddels voor alle gasfabrieklocaties op programmaniveau afspraken gemaakt met gemeenten en energiebedrijven. Vrijwel alle betrokken overheden verwachten dat de locaties, met behulp van marktdynamiek, vóór 2015 worden gesaneerd danwel beheerst. Dat geldt niet voor Rotterdam. In de voorgaande rapportages is aangegeven dat daarover aparte afspraken zijn gemaakt met VROM. De provincies Drenthe en Noord-Holland verwachten nog in deze tweede periode de voorbereiding van de sanering van al hun voormalige gasfabriekslocaties te hebben afgerond. In Noord-Holland was in de eerste periode al ruim tweederde (15 locaties) gestart en men verwacht in deze tweede periode zelfs vrijwel alles te hebben afgerond.

Herijking

De afspraken met VROM over het gasfabrieksprogramma lopen tot 2015. Als voorbereiding op de derde en laatste programmaperiode (2010-2015) zijn in 2008 alle saneringsprogramma's herijkt. De geraamde saneringskosten zijn geactualiseerd, op basis van de huidige inzichten in saneringsmogelijkheden en actuele prijsspeilen. Daarnaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en potentiële marktopbrengsten van de nog te saneren locaties opnieuw bezien. De minister heeft aangegeven dat zij:

- bij het toekennen van middelen voor de meerjarenprogramma bodemsanering zo mogelijk rekening zal houden met de resultaten van deze herijking;
- voorkeur heeft voor een finale financiële afwikkeling van het programma gasfabrieken vóór 2015;
- een argumentatie verlangt voor de hogere benodigde rijksbijdrage (dan 1/3 van de totale werkelijke kosten).

Benodigde Rijksbijdrage periode 2010-2014

Voor de derde programmaperiode (2010-2014) hebben de gezamenlijke overheden circa € 145,7 miljoen Rijksbijdrage nodig (dat is **inclusief** de aan de gasfabrieken gerelateerde waterbodemsaneringen van Friesland en Amsterdam)¹. Het behalen van de gewenste multiplier in deze laatste programmaperiode is, voor een deel van de locaties (vanwege het ontbreken van ruimtelijke ontwikkeling/dynamiek), een probleem, zo niet een onmogelijke opgave. De kosten van de aanpak van de gasfabrieken worden mede gefinancierd met de opbrengsten van de (her)ontwikkeling van locaties en gebieden. Bij veel locaties komen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen alleen tot stand als er voor het saneren en ontwikkelen een prikkel beschikbaar is (financieel, juridisch, anderszins). De huidige financieel-economische crisis maakt een succesvol beroep op bijdragen van derden echter te meer twijfelachtig.

Prognose doorlooptijd

Na 2014 vinden geen grondsaneringen meer plaats: die zijn voor die tijd gestart (Rotterdam uitgezonderd: andere afspraken). In 2015 starten nog 4 grondwatersaneringen op en 75,5 (grondwater/in-situ)saneringen (circa 50% van alle gasfabrieklocaties) lopen nog door tot (soms ver) na 2014. Dat is geen verrassing. In alle voorgaande voortgangsrapportages is gemeld dat het hele traject van de aanpak/herontwikkeling van deze locaties een lange doorlooptijd vergt.

¹ Dit bedrag is inmiddels achterhaald: Na 31-12-2008 is op verzoek van VROM met Amsterdam afgesproken om een deel van haar opgave en ook de daarmee gepaard gaande rijksbijdrage te temporiseren.

Kenmerk thm/2009.00091
Aan Stuurgroep gasfabrieken
Kopie Werkgroep B08
Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+)
Datum 2 april 2009
Onderwerp Herijking programma gasfabrieken

Aanleiding

De afspraken met VROM vanuit de intentieverklaring¹ over het gasfabriekprogramma lopen tot 2015². In de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage over 2007 aan minister Cramer hebben de bevoegde overheden aangegeven dat ze schatten voor de derde en laatste programmaperiode (2010-2014) nog minimaal €155,7 miljoen nodig te hebben³. Deze raming was nog onzeker en vanuit B08 is toegezegd dat de gezamenlijke overheden in 2008 dit bedrag zullen herijken vóór medio november, zodat dit op tijd kan worden ingebracht bij de budgetverdeling.

De geraamde saneringskosten zijn geactualiseerd op basis van de huidige inzichten in sanerings- en ontwikkelingsmogelijkheden en actuele prijspeilen. Uiteraard zijn, in lijn met de brief van 4 maart 2008 over 'Netteren van bestaande specifieke regelingen; Wet bodembescherming', alle bedragen genetteerd.

Als reactie op de voortgangsrapportage over 2006 geeft de minister aan dat:

- bij het toekennen van middelen zo mogelijk rekening zal worden gehouden met de resultaten van deze herijking;
- de voorkeur uitgaat naar een finale financiële afwikkeling van het gasfabriekenprogramma in 2015;
- de rijksbijdrage van 1/3 alleen hoger kan worden gesteld als blijkt dat er sprake is van een duidelijke verbetering van de milieukwaliteit dan wel een andere motivatie.

Doel

Gelet op bovenstaande is het doel van de herijking per bevoegd gezag een overzicht te geven van de volgende zaken en deze gezamenlijk in te dienen bij het Ministerie van VROM:

1. De veelal al geaccordeerde gasfabriekenprogramma's (2002-2014) actualiseren voor wat betreft planning en benodigde rijksbijdrage voor de laatste programmaperiode (voor zover relevant worden de kosten van nazorg ook opgenomen);
2. De argumentatie voor de hogere benodigde rijksbijdrage (dan 1/3 van de totale werkelijke kosten)

Gevolgte procedure

De herijking heeft de volgende stappen doorlopen:

- opstellen rekenblad met toelichting;
- invullen rekenblad door de overheden en aanleveren aan Bodem+;
- totaliseren gegevens, controleren en vinden aansluiting op voortgangsrapportages door Bodem+;
- bespreking van de resultaten op 25-9-2008 in de projectgroep B08;
- bijstelling gegevens;
- bespreking van de resultaten op 8-10-2008 (Bodem+/VROM);
- schriftelijke commentaarop de conceptnotitie;
- ambtelijke aanbieding van deze notitie (versie 3) aan de werkgroep budgetverdeling, op 10-12-2008;
- analyse van de multiplier door Bodem+: bestudering van de beschikkingen (2002-2004 en 2005-2009) met daarin de bestuurlijk gebonden bedragen en van alle voortgangsrapportages en de herijking voor de kostenkant.

¹ De 'Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabriekterreinen' omvat 148 gasfabrieklocaties.

² Voor Rotterdam zijn afwijkende afspraken vastgelegd, waardoor het programma daar langer zal doorlopen; daar zal ook na 2015 een rijksbijdrage nodig zijn.

³ Dat was **exclusief** de €8,4 mln voor aan gasfabrieken gerelateerde waterbodemsaneringen in Friesland.

Een aantal van deze stappen is hierna toegelicht.

Uitwerking in rekenblad

In het rekenblad met toelichting is een opzet gegeven voor een gecoördineerde herijking.

Voordeel van deze herijking is de vergelijkbaarheid en ontwikkeling van de resultaten op programmaniveau, waardoor een consistent beeld is neergezet over voortgang en benodigde middelen, terwijl afwijkingen zijn gemotiveerd.

De herijkingopzet is verwerkt in drie tabellen.

Tabel	Inhoud
1	een samenvatting van de nog benodigde rijksmiddelen in relatie tot de gehele programmaperiode, aangevuld met een specifieke ruimte om reeds programmatisch gemaakte afspraken met het Ministerie weer te geven, zie bijlage 1.
2	opgave lopende verplichtingen (periode tot 2010): maakt inzichtelijk welke verplichtingen per locatie zijn aangegaan (of voor 2008/2009 nog worden aangegaan) binnen de programmaperiode.
3	nog te verplichten opgave (periode 2010-2014): maakt inzichtelijk welke verplichtingen per locatie in de laatste periode zullen worden aangegaan.

In tabel 2 en 3 is ook expliciet aangegeven wat de doorlooptijd (planning) is van de projecten. Onder tabel 3 was er specifieke ruimte om eventuele opmerkingen over een doorlopende sanering na 2015 op te nemen (indien hiermee grote bedragen te verwachten zijn).

Resultaten

Afgesproken is te rapporteren op programmaniveau. Dit houdt in dat in deze rapportage zijn opgenomen:

- de totalen van tabel 1 waaruit de Benodigde Rijksbijdrage periode 2010-2014 volgt, zie bijlage 1;
- de prognose van de doorlooptijd van de projecten.

Benodigde Rijksbijdrage periode 2010-2014

Voor de derde programmaperiode (2010-2014) hebben de gezamenlijke overheden circa €145,7 miljoen Rijksbijdrage nodig⁴, zie bijlage 1. Dat is **inclusief** de aan de gasfabrieken gerelateerde waterbodemsaneringen van Friesland en Amsterdam.

Multiplier

Uit de analyse van de multiplier blijkt dat deze in 2003 rond de 2,47 (40% rijksbijdrage) zat en op basis van de gegevens van de herijking op 2,21 (45% rijksbijdrage) uitkomt (zonder Rotterdam). Duidelijk is dat:

- in de beschikkingen voor de periode 2002-2004, ook de bestuurlijk gebonden bedragen staan voor de periode 2005-2014;
- de multiplier vanaf het begin al ruim onder de 3 (meer dan 33% rijksbijdrage) ligt;
- in de beschikkingen voor de periode 2002-2004, VROM daarmee impliciet accoord is gegaan;
- maar liefst meer dan 50% van de kosten wordt gefinancierd buiten de rijksbijdrage om!

De behaalde multiplier verschilt per locatie en is uiteraard het gunstigst op dynamische locaties.

Locaties/ situaties waar dat ongunstiger uitpakt:

- statische locaties;
- waar beheersmaatregelen worden getroffen;
- waterbodems;
- waar verplichtingen zijn aangegaan onder het oude regiem (90% rijksbijdrage);
- waar cofinanciering door energiebedrijven is beperkt door overeenkomst op basis van voorgaande wet- en regelgeving, danwel in sommige regio's niet mogelijk was;
- regio's met beperkte herontwikkelingsmogelijkheden (slechte economische situatie).

⁴ Dit bedrag is inmiddels achterhaald: Na 31-12-2008 is op verzoek van VROM met Amsterdam afgesproken om een deel van haar opgave en ook de daarmee gepaard gaande rijksbijdrage te temporiseren.

Het behalen van de beoogde multiplier in de laatste programmaperiode is voor een deel van de locaties, vanwege het ontbreken van ruimtelijke ontwikkeling/dynamiek, een probleem, zo niet een onmogelijke opgave. De kosten van de aanpak van de gasfabrieken worden mede gefinancierd met de opbrengsten van de (her)ontwikkeling van locaties en gebieden. Bij veel locaties komen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen alleen tot stand als er voor het saneren en ontwikkelen een prikkel beschikbaar is (financieel, juridisch, anderszins). De huidige financieel-economische crisis maakt een succesvol beroep op bijdragen van derden echter te meer twijfelachtig.

Prognose doorlooptijd


Ter illustratie is hieronder zowel in een tabel als in een diagram per periode het aantal locaties aangegeven dat start met:

- grondsanering;
- herontwikkeling;
- grondwatersanering.

en tevens het aantal locaties waarvan de sanering wordt afgerond.

Duidelijk is dat na 2014 geen grondsanerungen meer plaatsvinden: die zijn voor die tijd gestart (Rotterdam uitgezonderd: andere afspraken). In 2015 starten nog 4 grondwatersanerungen op en 75,5 (grondwater/in-situ)sanerungen (circa 50% van alle gasfabrieklocaties) lopen nog door tot (soms ver) na 2014. Dat is geen verrassing. In alle voortgangsrapportages is gemeld dat het hele traject van de aanpak/herontwikkeling van deze locaties een lange doorlooptijd vergt.

Periode	Aantal							
	2010-2014				≥2015			
	Start			Einde	Start			Einde
Gezag	grondsanering	herontwikkeling	sanering grondwater	sanering	grondsanering	herontwikkeling	sanering grondwater	sanering
Friesland	4	4	9	1				10
Groningen	1	2	2					5
Drenthe				1				2
Overijssel	2	3	1	4				8
Gelderland	13,5	10,5	13	3	4		2	22,5
Noord-Holland	1	3	5	7				5
Zuid-Holland	12	9	3	5				7
Utrecht								1
Noord-Brabant	2	2	2					2
Limburg								
Amsterdam	2	1	2	1		1		2
Rotterdam	4	1	3			3		11
Totaal	41,5	35,5	40	22	0	8	4	75,5

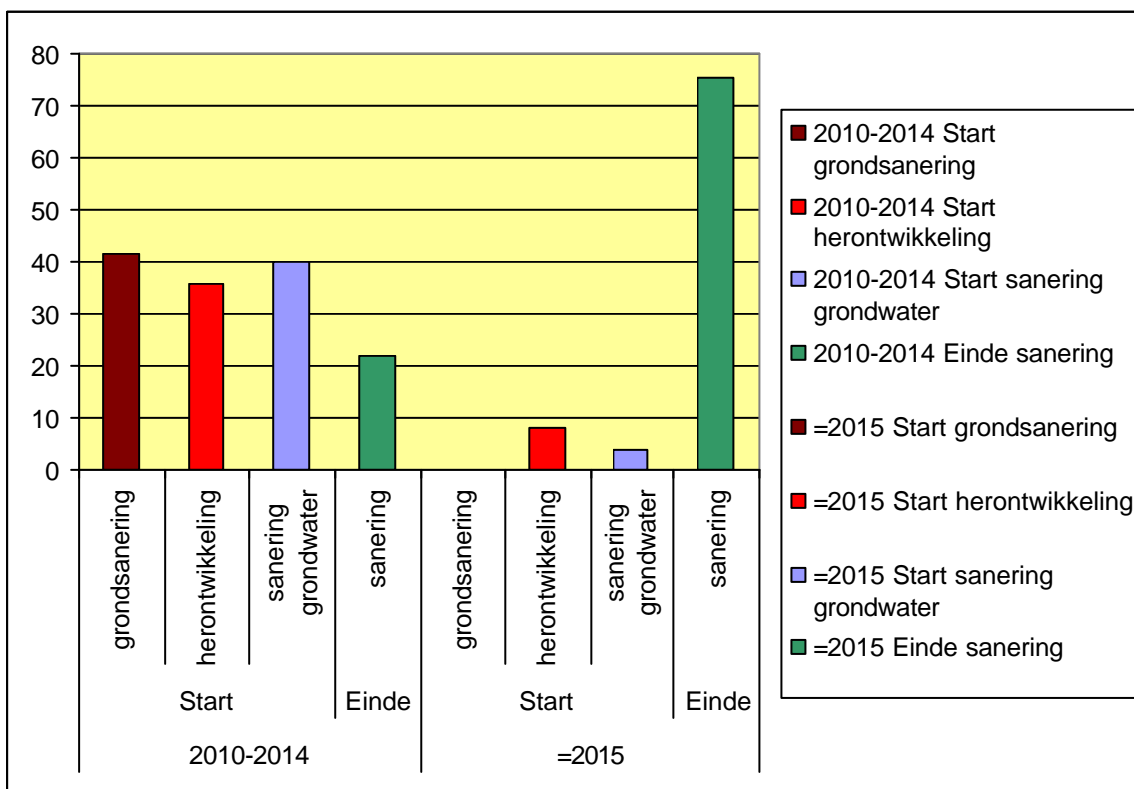

Bijlage 1: Samenvatting Rijksbijdrage; Herijking Programma gasfabrieken

10-12-2008

Zuid Holland

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte bijdrage (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	9	38.743.930	1.000.000	12.196.802
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	12	44.444.000	2.000.000	21.729.600
	21	83.187.930	3.000.000	33.926.402

Programmatische bijdrage rijk (€)	0
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	9.770.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	10.900.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015	13.256.402

Amsterdam

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		64.957.265	nvt	32.193.675
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)		131.340.569	nvt	59.800.628
		196.297.834		91.994.303

Programmatische bijdrage rijk (€) excl. 19% BTW	
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	0
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009*	19.794.872
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015	72.199.432

*De Rijksbijdrage Westergas tot 2010 niet meegenomen omdat deze o.i. uit andere budgetten zijn bekostigd

Gelderland

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	17,5	22.993.909	nvt	8.057.188
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	13,5	34.798.392	500.000	12.454.578
	31	57.792.301		20.511.766

Programmatische bijdrage rijk (€)	
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	319.461
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	7.795.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015	12.397.305

Noord-Brabant

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	5	11.475.000		6.137.000
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	2	5.175.000		1.035.000
	7	16.650.000		7.172.000

Programmatische bijdrage rijk (€)	
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	3.360.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	4.500.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015	0

Overijssel

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		44.047.479	0	19.329.972
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)		10.184.874	0	3.879.218
		54.232.353	0	23.209.190

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	7.580.000	6.369.748
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	10.220.000	8.588.235
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		8.251.207

Groningen

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	4	20.656.224		15.427.819
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	1	4.785.714		3.828.571
	5	25.441.939	0	19.256.391

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	2.598.400	2.183.529
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	13.400.000	11.260.504
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		5.812.357

Utrecht

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		3.955.968	300.000	1.859.673
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	7	2.575.000	200.000	1.057.475
		6.530.968		2.917.148

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	703.000	590.756
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	1.498.000	1.258.824
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		1.067.568

Noord-Holland

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		70.224.957	nvt	30.809.490
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)		0	nvt	0
		70.224.957		30.809.490

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004		3.334.014
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009		15.791.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		11.684.476

Friesland

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	5	10.922.016	nvt	4.844.304
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	9	11.004.354	nvt	5.884.741
		21.926.370		10.729.045

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	2.018.488	1.696.208
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	4.435.489	3.727.302
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		5.305.535

Rijksbijdrage gasfabriek waterbodems Fryslan

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		saneringskosten gafa+onderh slib	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen		4.416.115	nvt	2.899.341
Nog aan te gane verplichtingen		9.281.791	nvt	4.867.998
		13.697.906		7.767.339

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	1.453.814	1.221.692
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	2.153.694	1.809.827
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		4.735.819

Rotterdam

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		12.535.000	0	12.228.500
Nog aan te gane verplichtingen tot 2015 (bijlage 2)		17.275.000	0	14.746.250
		29.810.000		26.974.750

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	2.094.575	1.954.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	12.550.000	11.700.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015**		10.980.000

* Er zijn specifieke afspraken voor Rotterdam

**Uitkomst moet zijn 14,75 - 3,77 (restant periode 2005-2009) = 10,98 miljoen euro excl. BTW

Limburg

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)		0	0	0
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	5	3.980.000	0	1.613.575
	5	3.980.000	0	1.613.575

Programmatische bijdrage rijk (€)	incl. BTW	excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004	830.000	697.479
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009	1.070.000	899.160
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015		16.936

Drenthe

Gasfabrieklocaties	Aantal locaties	Geraamde kosten (€ excl. BTW)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
		Sanering	Sanering	Totaal Benodigd (berekend)
Lopende verplichtingen (bijlage 1)	3			
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2)	0			
	3	0	0	8.100.000
Programmatistische bijdrage rijk (€)				
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004				3.950.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009				6.000.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015				0

Totaal

	Aantal locaties	Bijdrage Rijk (€ Voortgangsrap)	Bandbreedte kosten (€ excl. BTW)	Bijdrage Rijk (€)
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004		42.694.840		36.557.938
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009		120.443.489		107.954.361
Totaal benodigde rijksbijdrage 2010-2015		155.706.643	3.700.000	145.707.037
		318.844.972		290.219.336

Correctie AD, NH, GR Rijksbijdrage 2002-2004				6.136.600
Correctie AD, GR Rijksbijdrage 2005-2009				12.489.128
Aansluiting Rijksbijdrage 2002-2004		-302		42.694.538
Aansluiting Rijksbijdrage 2005-2009		0		120.443.489
